





## **GPI**

### **Gerenciador de Projetos Integrado: uma ferramenta para auxiliar gerentes de projetos de software - módulo de controle de atividades**

Novembro/2008

## Conjuntura das fábricas (indústrias)

Desenvolvimento  
to Ad-hoc

Departamentaliza  
ção (processos)

Automação e  
Informatização

Aparecimento  
dos SIGEs



## Conjuntura das fábricas de Software

Desenvolvimento  
Ad-hoc

Processo Eng.  
Sw

-CMMI, MPS-BR

Processo de  
Gestão de  
Projetos


Esse seria o próximo passo?

Aparecimento  
dos SIGE p/proj  
SW



## ■ OBJETIVO GERAL

- Iniciar a construção de um Sistema de Informação Gerencial que integre os processos das nove áreas da gestão de projetos descritas no PM-

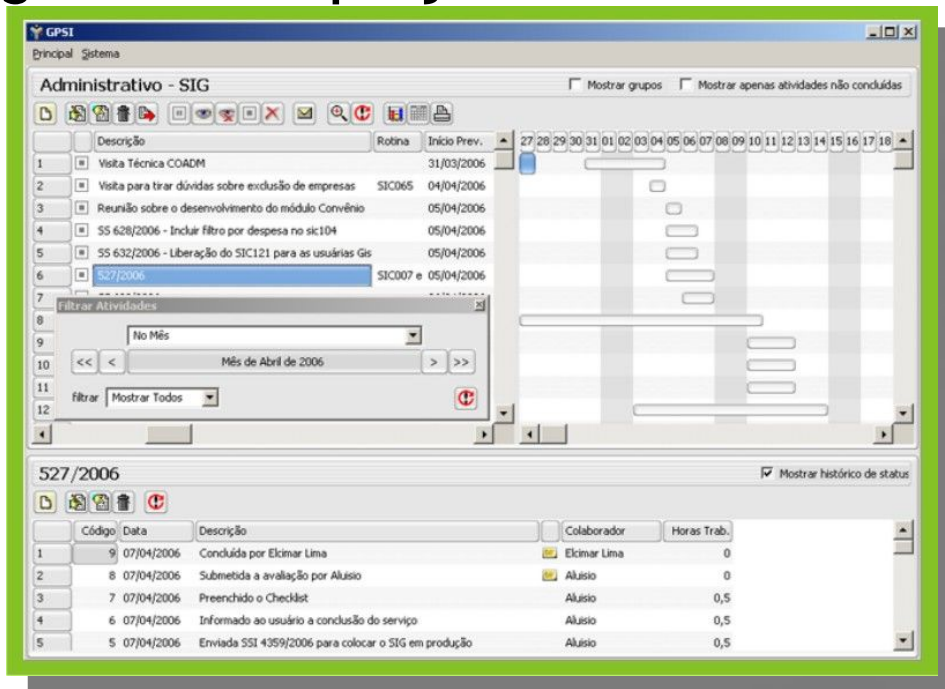

## ■ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Construir o módulo de planejamento e controle de atividades do Gerenciador de Projetos Integrado (GPI);
- 2. Implantar o GPI em uma fábrica de software (teste piloto);
- 3. Identificar necessidade de manutenções corretivas e evolutivas relacionadas ao GPI;
- 4. Publicar artigos científicos sobre os resultado;
- 5. Divulgar resultados para fábricas



## ■ ESTRATÉGIA

- 1. Levantar os principais sistemas de informação que auxiliam no desenvolvimento de projetos de software;
- 2. Realizar um estudo sobre os processos, produtos e necessidades informacionais relacionadas à gestão de projetos de software;
- 3. Identificar os requisitos funcionais, realizar análise e projeto do módulo de planejamento e controle de atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos de software;



## ■ ESTRATÉGIA


- 4. Construir, testar e implantar o módulo de planejamento e controle de atividades em uma fábrica de software;
- 5. Analisar os impactos gerados pela utilização do GPI;
- 6. Apresentar os resultados em forma de relatório e artigos científicos




## - Gerenciador de Projetos Integrado



## ■ RELEVÂNCIA

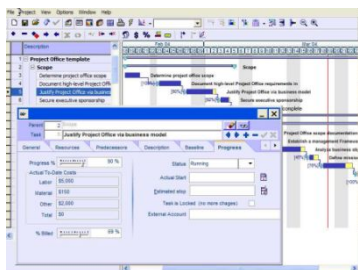


## WBS Chart Pro

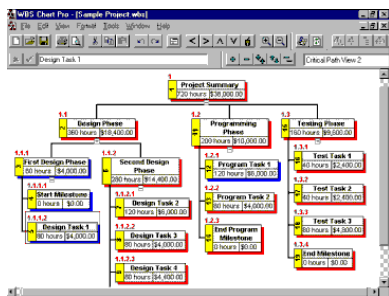

*Foco nas atividades de integração manual ao invés de direcionar os esforços para atividades que agreguem valor direto ao projeto.*

## ■ RELEVÂNCIA

- Os inúmeros aplicativos e sistemas sem integração utilizados durante a gestão de projetos de software aumentam a carga de trabalho dos gerentes de projetos e sua equipe: replicação de informações, inconsistências de dados, tempo excessivo de execução de relatórios, etc.

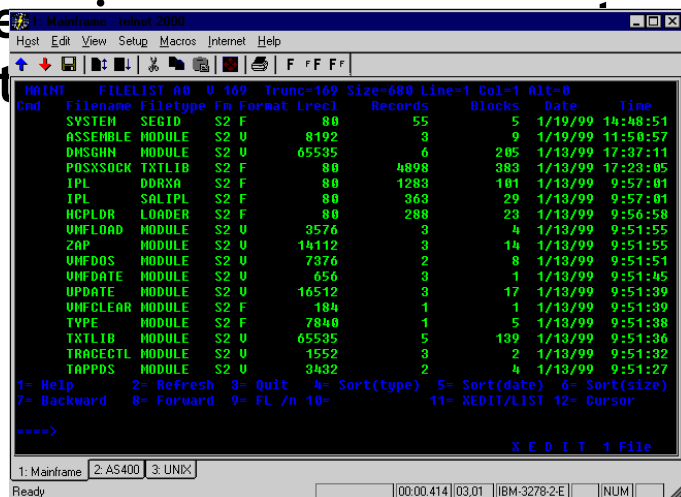

## ■ ABRANGÊNCIA;




## ■ INOVAÇÃO;

- CRIAÇÃO DE UM SIGE VOLTADO PARA GESTÃO DE PROJETOS



## ■ IMPACTO;

- Criação de linguagem comum
- Centralização do controle e acesso às informações
- Aumento da interação entre o gerente e seus colaboradores
- Maior organização e visibilidade das atividades a serem desenvolvidas
- Aumento da visibilidade sobre o andamento das atividades da equipe em tempo real
- Distribuição do esforço com o registro de eventos relacionados ao projeto

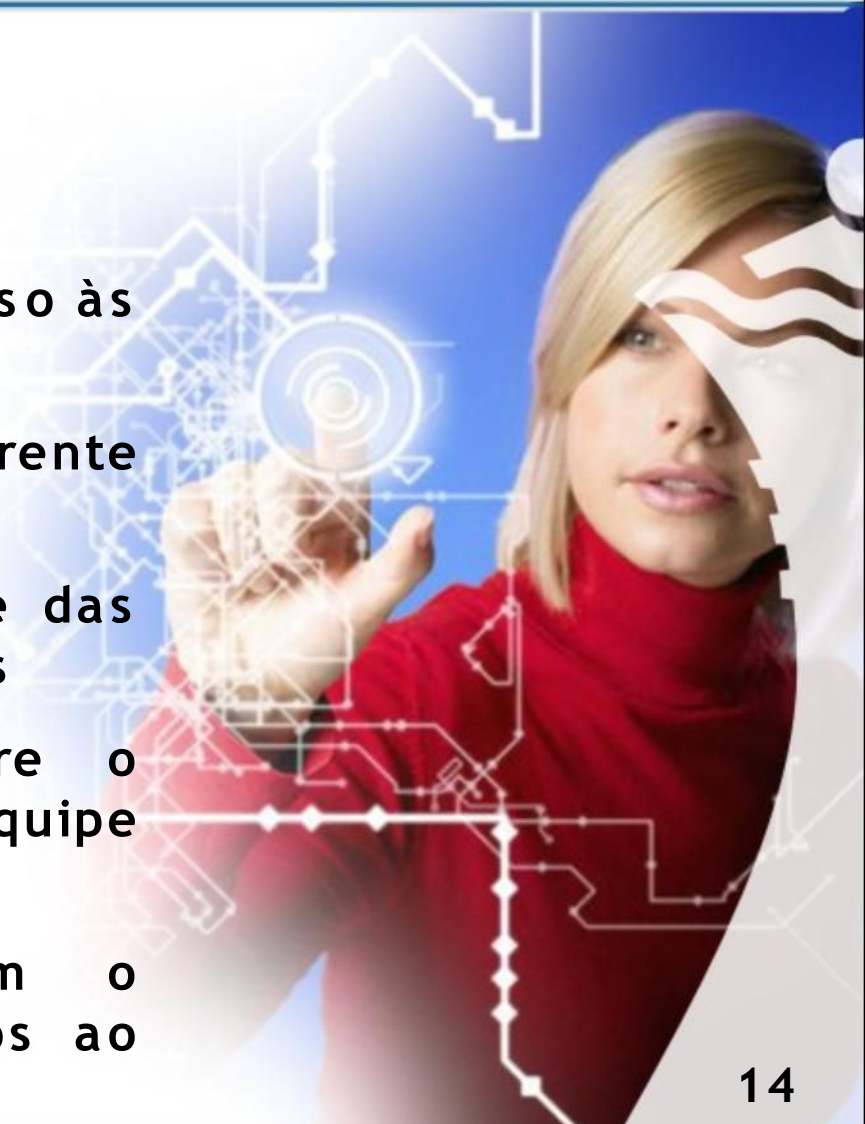

# Cronograma do PROJETO

Levantar principais sistemas de GP


Identificar os requisitos mais relevantes

Criar o GPI (módulo controle de atividades)

Implantar projeto piloto

Identificar pontos de melhoria no sistema

Realizar manutenções evolutivas

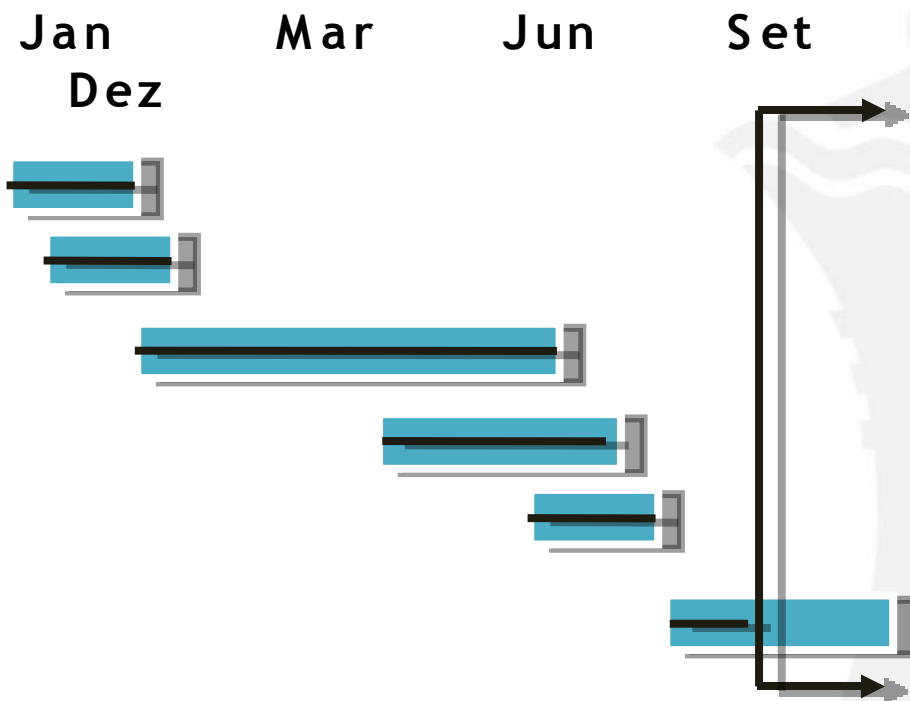

# Resultados Alcançados (parcial)



16

## Gerenciador

- GPSI - Jdg memoria
- GPSI v2
- GPSI v2 - old
- Manaus Hotéis
- PGOV-Escritório de Projetos
- PGOV-NUSI
- PGOV-NUSI Teste
- PHILIPS - SADO
- PORTAL: Gerência de Configuração
- PORTAL: Implantacao GPSI
- PORTAL: PMN
- PORTAL: PMN\_Receb
- PORTAL: PMN\_Vistoria
- PORTAL: Proj. Gráficos
- PORTAL: Proj. Indicadores
- PORTAL: Projetos Industriais
- PORTAL: Sistema de Segurança
- PROJETO CEMITA
- PROJETO EXEMPLO**
  - Versões
    - Plano Gerencial
      - Grupos
        - Iteração 1
        - Retrabalho
        - Extra Projeto
        - testes
        - Sincronizacao
- Processo de Aquisição
- Projeto ICON
- Projeto ICON
- SIMEX Documentação
- SIMEX Sustentação
- SINAL Documenta??o
- SINAL Sustenta??o
- SIPLA Documentação
- SIPLA Sustentação
- SIPRO Documentação
- SIPRO Sustentação

### Editando Projeto

Propriedades Colaboradores

|   | Colaborador        | Tipo            |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Rayfran Rocha Lima | ✓ Administrador |
| 2 | Usuario 005        | ✓ Administrador |
| 3 | usuario 011        | ✓ Administrador |
| 4 | usuario014         | ✓ Administrador |

Adicionar  
Remover

OK Cancelar

### Editando Versão

Propriedades Colaboradores Características

|   | Colaborador        | Tipo        |
|---|--------------------|-------------|
| 1 | Rayfran Rocha Lima | ✓ Moderador |
| 2 | Usuario 006        | ✓ Moderador |
| 3 | Usuario 007        | ✓ Moderador |
| 4 | usuario 016        | ✓ Moderador |
| 5 | usuario012         | ✓ Moderador |
| 6 | usuario013         | ✓ Moderador |
| 7 | usuario014         | ✓ Moderador |

Adicionar  
Remover

OK Cancelar

## Gerenciador

- Tabelas
  - Clientes
  - Colaboradores
  - Características
  - Tipos de Grupo de Atividades
  - Modelos de Grupo de Atividades
  - Unidades
- Projetos
  - GPSI Sug Melhor.
  - GPSI v2
  - ICON
    - Versões
      - Plano Gerencial
        - Grupos
          - Atividades Intern.
          - Orientacao Tr
          - PBQP
        - Clientes
  - PHILIPS - SADO
  - PROJETO EXEMPLO
    - Versões
      - Plano Gerencial
    - Projeto SCRUM

## PROJETO EXEMPLO - Plano Gerencial

☒ Mostrar apenas atividades não concluídas

## Descrição

Plano Gerencial

## Justificativa

Este projeto foi criado para desenvolver um ERP voltado para Gestao de Projetos. Esta é um exemplo de justificativa.

**Data Inicial Prevista** 11/07/2006  
**Data Final Prevista** 12/07/2007

## Colaboradores

Rayfran; usu006; usu007; usu016; usu012;  
usu013; usu014; usu017

## Andamento

58 % concluído

## Status/Progress

PH PHC EHC HPI

0.00 0.00 0.00 0.00

TPH EHAC PPH EHTC

1335.83 0.00 0 % 0.00

## 55 atividade(s) não lidas

4 atividade(s) em andamento

3 atividade(s) em pausa

0 atividade(s) em atraso

Todo o projeto

&lt;&lt; &lt; Todo o projeto &gt; &gt;&gt;

|    | Descrição                                 | Prev. Término | Horas Prev. | Colaboradores           |
|----|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 1  | Reunião na CGMEC                          | 17/07/2006    | 9           | Rayfran; usu007; usu013 |
| 2  | Criar WBS Geral do Projeto e Atualizar GI | 05/09/2006    | 30          | Rayfran                 |
| 3  | Estabelecer estimativa de esforço, tamar  | 13/09/2006    | 12          | Rayfran                 |
| 4  | Apresentar estimativa de esforço, tamar   | 14/09/2006    | 3           | Rayfran                 |
| 5  | Elaboracao do Relatorio de Status do Prc  | 07/09/2006    | 2.5         | Rayfran                 |
| 6  | Elaboracao do Relatorio de Status do Prc  | 21/09/2006    | 2.5         | Rayfran                 |
| 7  | Reuniao com Gerente Senior 4              | 07/09/2006    | 1.5         | Rayfran                 |
| 8  | Reuniao com Gerente Senior 5              | 21/09/2006    | 1.5         | Rayfran                 |
| 9  |                                           |               |             |                         |
| 10 |                                           |               |             |                         |
| 11 | Reuniao com Coordenador do CSER 2         | 20/09/2006    | 1.5         | Rayfran                 |
| 12 |                                           |               | 1.5         | Rayfran                 |
| 13 |                                           |               | 1.5         | Rayfran                 |
| 14 | Reuniao com Gerente Config. E Ambient     | 20/09/2006    | 1.5         | Rayfran                 |
| 15 | Coletar M9 2                              | 05/09/2006    | 0.5         | Rayfran                 |
| 16 | Coletar e Analisar M8                     | 11/09/2006    | 2           | Rayfran                 |
| 17 | Divulgar Resultado                        | 12/09/2006    | 0.5         | Rayfran                 |
| 18 |                                           |               |             |                         |
| 19 |                                           |               |             |                         |
| 20 | Divulgar Resultado                        | 25/09/2006    | 1           | Rayfran                 |
| 21 | Coletar e Analisar Metrica M6             | 22/09/2006    | 0.5         | Rayfran                 |
| 22 | Divulgar Resultado da Metrica M6          | 25/09/2006    | 1           | Rayfran                 |
| 23 |                                           |               |             | Rayfran                 |
| 24 |                                           |               |             | usu013                  |
| 25 | Teste 3                                   | 16/01/2007    | 8           |                         |
| 26 | Teste 4                                   | 16/02/2007    | 8           |                         |
| 27 | Rayfran 17                                | 20/12/2006    | 8           |                         |

## Informações sobre o projeto

## Status do projeto

## Índices de Valor Agregado

## Resumo das atividades

## Gerenciador

- Tabelas
  - Clientes
  - Colaboradores
  - Características
  - Tipos de Grupo de Atividades
  - Modelos de Grupo de Atividades
  - Unidades
- Projetos
  - GPSI Sug Melhor.
  - GPSI v2
  - ICON
    - Versões
    - Plano Gerencial
      - Grupos
        - Atividades Intern.
        - Orientacao Tr
        - PBQP
      - Clientes
  - PHILIPS - SADO
  - PROJETO EXEMPLO
    - Versões
    - Plano Gerencial
      - Grupos
        - Iteração 1
        - Retrabalho
        - Extra Projeto
        - testes
        - Sincronizacao
  - Projeto SCRUM

## Atividades

☒ Mostrar grupos ☐ Mostrar apenas atividades não concluídas

|    | Código | Descrição                               | Rotina | Início Prev. | Final Prev. | Horas Prev. | C | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|----|--------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 41 | 111    | Reuniao com Cliente                     |        | 10/08/2006   | 10/08/2006  | 6           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42 | 110    | Elaboracao do Documento de Visao        |        | 07/08/2006   | 11/08/2006  | 37.5        | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43 | 46     | Coleta 6                                |        |              |             |             |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44 | 188    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip   |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 4           | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45 | 190    | Apresentacao do Doc. De Visao para o I  |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46 | 207    | Elaboracao da apresentacao para marie   |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 8           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 47 | 191    | Apresentacao do Doc. Visao para Maria   |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 4.5         | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48 | 200    | Visita a Prodam - NFe                   |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 2.5         | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 49 | 208    | Apresentacao do DV para Karina          |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 1.5         | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50 | 189    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip   |        | 15/08/2006   | 16/08/2006  | 4           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 51 | 192    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip   |        | 16/08/2006   | 16/08/2006  | 6           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52 | 193    | Levantar todas as Portarias e Convenio  |        | 16/08/2006   | 16/08/2006  | 0.5         | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 53 | 194    | Atualizacao do Questionario             |        | 14/08/2006   | 17/08/2006  | 8           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54 | 203    | Discussao sobre o Doc de Visao com Ma   |        | 17/08/2006   | 17/08/2006  | 7           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55 | 197    | Revisao do Doc de Visao                 |        | 14/08/2006   | 18/08/2006  | 6           | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56 | 209    | Apresentacao do DV ao Hélio Lima e Art  |        | 18/08/2006   | 18/08/2006  | 2           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 57 | 210    | Reuniao com a Maria do Carmo            |        | 18/08/2006   | 18/08/2006  | 11          | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58 | 211    | Elaboracao da apresentacao das inform   |        | 18/08/2006   | 18/08/2006  | 8           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 59 | 196    | Validar Documento Visao cf portaria e o |        | 19/08/2006   | 19/08/2006  | 3.5         | u |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60 | 195    | Apresentacao do Doc. Visao para Richa   |        | 22/08/2006   | 22/08/2006  | 2.5         | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 61 | 356    | reuniao com vitor 1                     |        | 11/07/2007   | 11/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 62 | 357    | reuniao com vitor 2                     |        | 16/07/2007   | 16/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 63 | 358    | reuniao com vitor 3                     |        | 18/07/2007   | 18/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 64 | 359    | reuniao com vitor 4                     |        | 23/07/2007   | 23/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 65 | 360    | reuniao com vitor 5                     |        | 25/07/2007   | 25/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 66 | 361    | reuniao com vitor 6                     |        | 30/07/2007   | 30/07/2007  | 3           | R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

/istoria

☒ Mostrar histórico de status


## Gerenciador

- Tabelas
  - Clientes
    - Colaboradores
    - Características
    - Tipos de Grupo de Atividades
    - Modelos de Grupo de Atividades
    - Unidades
- Projetos
  - GPSI Sug Melhor.
  - GPSI v2
  - ICON
    - Versões
      - Plano Gerencial
        - Grupos
          - Atividades Intern.
          - Orientacao Tr
          - PBQP
          - Clientes
  - PHILIPS - SADO
  - PROJETO EXEMPLO
    - Versões
      - Plano Gerencial
        - Grupos
          - Iteração 1
          - Retrabalho
          - Extra Projeto
          - testes
          - Sincronizacao
  - Projeto SCRUM

## Atividades

☒ Mostrar grupos ☐ Mostrar apenas atividades não concluídas

|    | Código | Descrição                             | Rotina | Início Prev. | Final Prev. | Horas Prev. | Colaboradores           | Requisitos | WBS     |
|----|--------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|---------|
| 41 | 111    | Reuniao com Cliente                   |        | 10/08/2006   | 10/08/2006  | 6           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.5 |
| 42 | 110    | Elaboracao do Documento de Visao      |        | 07/08/2006   | 11/08/2006  | 37.5        | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.5 |
| 43 | 46     | Coleta 6                              |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 44 | 188    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 4           | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 45 | 190    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 46 | 207    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 47 | 191    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 48 | 200    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 49 | 208    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 50 | 189    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 51 | 192    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 52 | 193    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 53 | 194    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 54 | 203    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 55 | 197    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 56 | 209    |                                       |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |

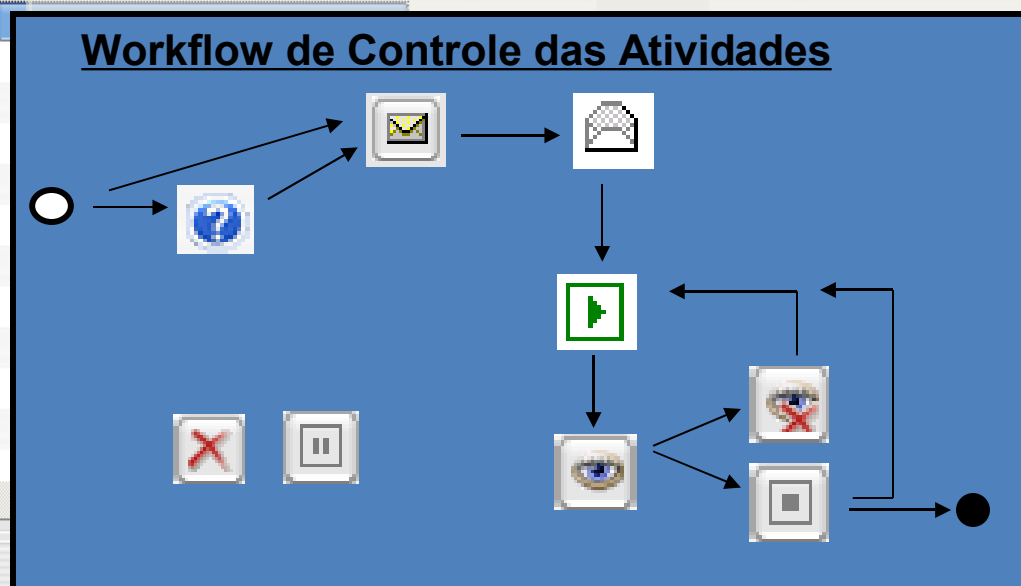

Totais reais da atividade corrente

| Duração | Data Inicial | Data Final | Esforço (h) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 0       | 14/08/2006   | 14/08/2006 | 3           |

|   | Código | Data       | Descrição                    | Colaborador | Horas Trab. |
|---|--------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 5      | 15/08/2006 | Concluída por Rayfran        | Rayfran     | 0           |
| 2 | 4      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | usu013      | 1           |
| 3 | 3      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | usu007      | 1           |
| 4 | 2      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | Rayfran     | 1           |
| 5 | 1      | 14/08/2006 | Lida por Andrea              | usu007      | 0           |

## Gerenciador

- Tabelas
  - Clientes
  - Colaboradores
  - Características
  - Tipos de Grupo de Atividades
  - Modelos de Grupo de Atividades
  - Unidades
- Projetos
  - GPSI Sug Melhor.
  - GPSI v2
  - ICON
    - Versões
      - Plano Gerencial
        - Grupos
          - Atividades Intern.
          - Orientacao Tr
          - PBQP
        - Clientes
  - PHILIPS - SADO
  - PROJETO EXEMPLO
    - Versões
      - Plano Gerencial
        - Grupos
          - Iteração 1
          - Retrabalho
          - Extra Projeto
          - testes
          - Sincronizacao
  - Projeto SCRUM

## Atividades

☒ Mostrar grupos ☐ Mostrar apenas atividades não concluídas

|    | Código | Descrição                              | Rotina | Início Prev. | Final Prev. | Horas Prev. | Colaboradores           | Requisitos | WBS     |
|----|--------|----------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|---------|
| 41 | 111    | Reuniao com Cliente                    |        | 10/08/2006   | 10/08/2006  | 6           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.5 |
| 42 | 110    | Elaboracao do Documento de Visao       |        | 07/08/2006   | 11/08/2006  | 37.5        | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.5 |
| 43 | 46     | Coleta 6                               |        |              |             |             |                         |            | 5.5.1.6 |
| 44 | 188    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip  |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 4           | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 45 | 190    | Apresentacao do Doc. De Visao para o   |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 3           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.6 |
| 46 | 207    | Elaboracao da apresentacao para marie  |        | 14/08/2006   | 14/08/2006  | 8           | Rayfran; usu013         |            | 5.5.1.6 |
| 47 | 191    | Apresentacao do Doc. Visao para Maria  |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 4.5         | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 48 | 200    | Visita a Produm - NFe                  |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 2.5         | usu007                  |            | 5.5.1.6 |
| 49 | 208    | Apresentacao do DV para Karina         |        | 15/08/2006   | 15/08/2006  | 1.5         | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 50 | 189    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip  |        | 15/08/2006   | 16/08/2006  | 4           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.6 |
| 51 | 192    | Apresentacao do Doc. Visao para Equip  |        | 16/08/2006   | 16/08/2006  | 6           |                         |            | 5.5.1.6 |
| 52 | 193    | Levantar todas as Portarias e Convenio |        | 16/08/2006   | 16/08/2006  | 0.5         | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 53 | 194    | Atualizacao do Questionario            |        | 14/08/2006   | 17/08/2006  | 8           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.6 |
| 54 | 203    | Discussao sobre o Doc de Visao com Ma  |        | 17/08/2006   | 17/08/2006  | 7           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.6 |
| 55 | 197    | Revisao do Doc de Visao                |        | 14/08/2006   | 18/08/2006  | 6           | usu007; usu013          |            | 5.5.1.6 |
| 56 | 209    | Apresentacao do DV ao Hélio Lima e Art |        | 18/08/2006   | 18/08/2006  | 2           | Rayfran; usu007; usu013 |            | 5.5.1.6 |

Planejado

☒ Mostrar histórico de status

Totais reais da atividade corrente

| Duração | Data Inicial | Data Final | Esforço (h) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 0       | 14/08/2006   | 14/08/2006 | 3           |

Realizado

|   | Código | Data       | Descrição                    | Colaborador | Horas Trab. |
|---|--------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 5      | 15/08/2006 | Concluída por Rayfran        | Rayfran     | 0           |
| 2 | 4      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | usu013      | 1           |
| 3 | 3      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | usu007      | 1           |
| 4 | 2      | 14/08/2006 | Participacao na apresentacao | Rayfran     | 1           |
| 5 | 1      | 14/08/2006 | Lida por Andrea              | usu007      | 0           |

Registros dos esforços

# Gerenciador

- GPST - Sug. melhor.
- GPST v2
- GPST v2 - old
- Manaus Hotéis
- PGOV-Escritorio de Projetos
- PGOV-NUSI
- PGOV-NUSI Teste
- PHILIPS - SADO
- PORTAL: Gerência de Configuração
- PORTAL: Implantacao GPST
- PORTAL: PMN
- PORTAL: PMN\_Receb
- PORTAL: PMN\_Vistoria
- PORTAL: Proj. Gráficos
- PORTAL: Proj. Indicadores
- PORTAL: Projetos Industriais
- PORTAL: Sistema de Segurança
- PROJETO CEMITA
- PROJETO EXEMPLO**
  - Versões
    - Plano Gerencial
      - Grupos
        - Iteração 1
        - Retrabalho
        - Extra Projeto
        - testes
        - Sincronizacao
- Processo de Aquisição
- Projeto ICON
- Projeto ICON
- SIMEX Documentação
- SIMEX Sustentação
- SINAL Documenta??o
- SINAL Sustenta??o
- SIPLA Documentação
- SIPLA Sustentação
- SIPRO Documentação
- SIPRO Sustentação

|    | Código | Unidade | Nome                   | Matrícula | Fone     |
|----|--------|---------|------------------------|-----------|----------|
| 49 | 20     | Fucapi  | Daniel Dutra de Moraes | 2461      | 614-3045 |
| 50 | 41     | Fucapi  | Danny de Souza Lopes   | 15610     | 36143046 |
| 51 | 96     | Fucapi  | David de Souza Tavares | 2983      | 3614-305 |
| 52 | 36     | Fucapi  | Dayse Rocha            | 2743-0    | 614-3046 |
| 53 | 120    | Fucapi  | Demitido               | 2556      |          |
| 54 | 154    | Fucapi  | Desiree Lima Tapajos   | 22734     |          |
| 55 | 123    | Fucapi  | Diego Falcao de Souza  | 2909      |          |
| 56 | 135    | Fucapi  |                        |           | 92 3614  |
| 57 | 115    | Fucapi  |                        |           | 809-806  |
| 58 | 44     | Fucapi  |                        |           | 14-3046  |
| 59 | 151    | Fucapi  |                        |           |          |
| 60 | 4      | Fucapi  |                        |           |          |
| 61 | 168    | Fucapi  |                        |           |          |

186 registro(s)

Editando Colaborador

Propriedades
Usuário e Senha
Acesso ao Sistema

Marcar todos
Desmarcar todos

|    | Acesso                         |
|----|--------------------------------|
| 17 | Excluir Esforço                |
| 18 | Avaliar Atividade              |
| 19 | Concluir Atividade             |
| 20 | Clientes                       |
| 21 | Colaboradores                  |
| 22 | Características                |
| 23 | Tipos de Grupo de Atividades   |
| 24 | Modelos de Grupo de Atividades |

OK
Cancelar



# PERGUNTAS?

23

# Agradecemos sua atenção!



**Rayfran Rocha, PMP, Msc.**

(92 ) 91 22 -2093

rayfran.rocha@iconsolucoes.com

24
